



XIV – то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.


Инж. Лазар Лазаров
Председател на Управителния съвет

05 - 06 юни 2013 г.
гр. Несебър





ПЪТНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" (2007 - 2013 г.)

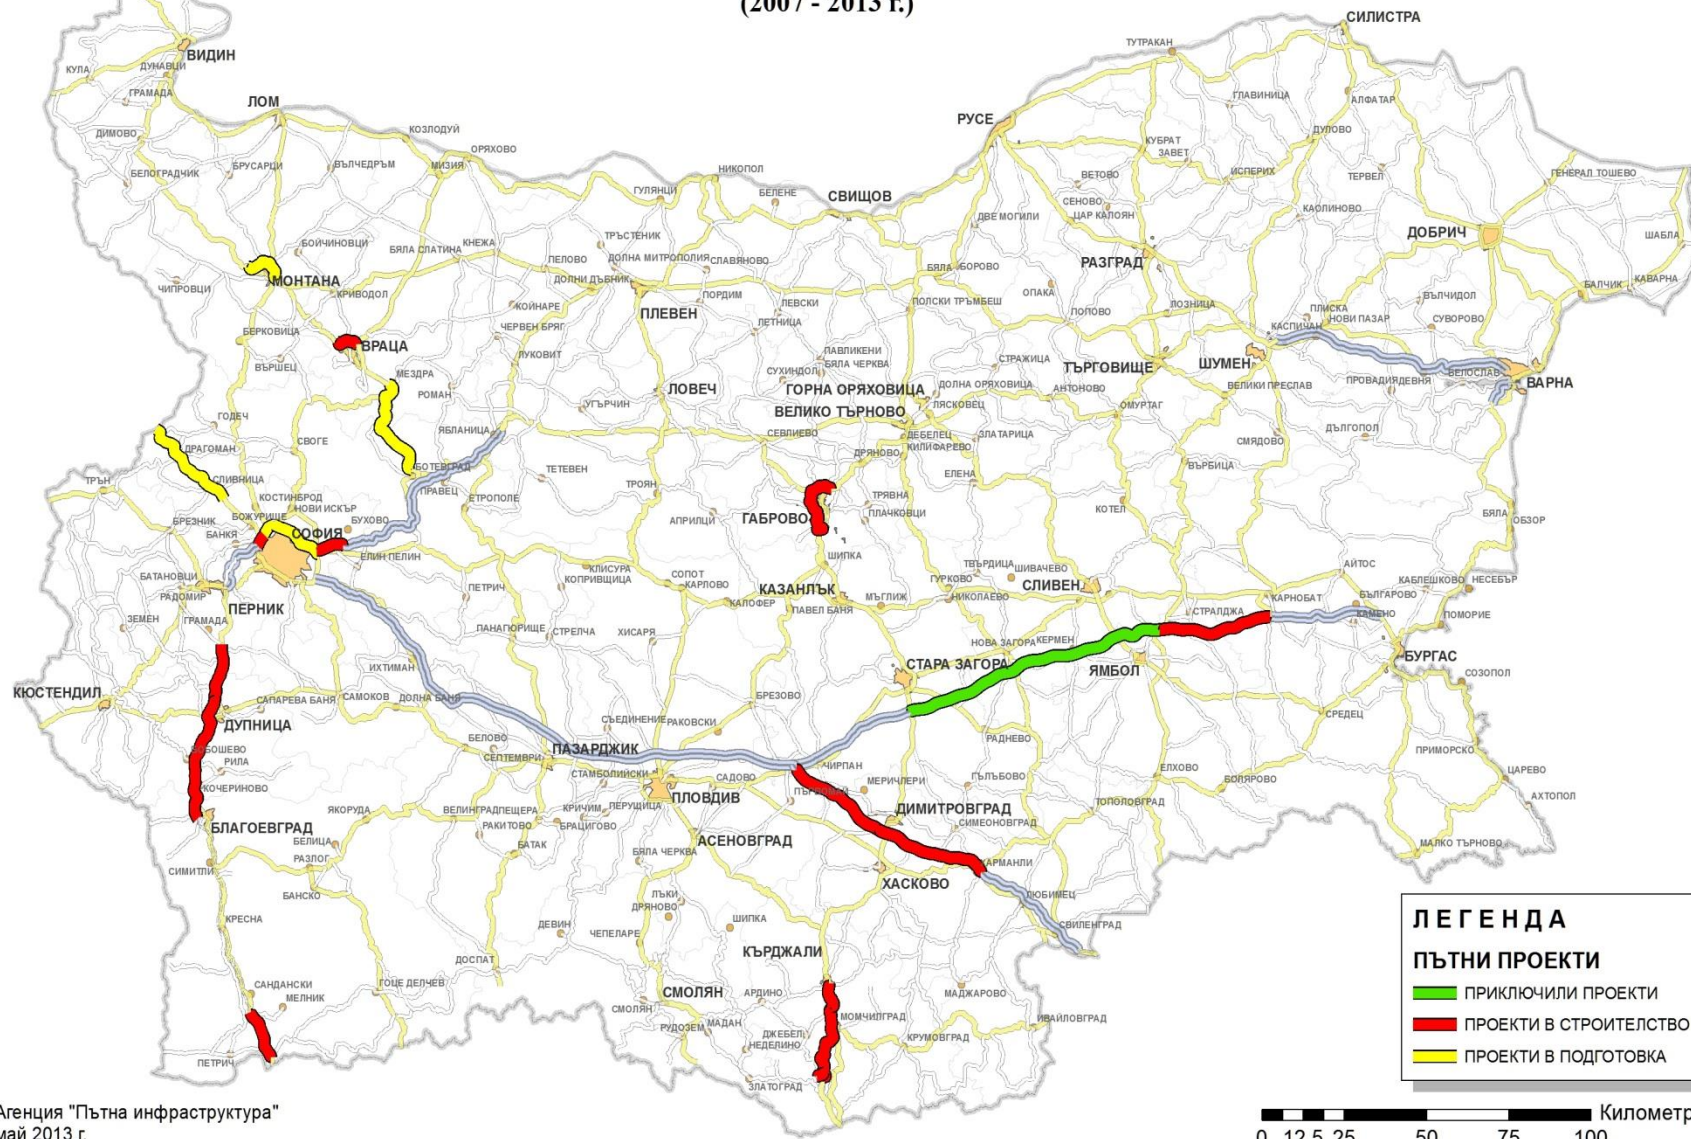



АМ "Тракия", Лот 2 "Стара Загора - Нова Загора"

от км 210+100 до км 241+900, дължина – 31,80 км

Дейност	Изпълнител	Ст-ст на договора с ДДС
Строителство	Обединение "Магистрала Трейс" ДЗЗД	137 868 000,00 лв.
Консултантски услуги	"Пътинвест-инженеринг" АД	1 349 578,80 лв.
Авторски надзор	„Пътпроект“ ЕООД	112 800,00 лв.

- Начало на строителните дейности: 09.06.2010 г.
- Срок за изпълнение на строителството: 25 месеца
- Край на строителните работи съгласно договора: юли 2012 г.

Финансово изпълнение:

- Извършени са всички плащания към изпълнителя: 137 868 000,00 лв.



18/09/2012 15:16



18/09/2012 15:08



18/09/2012 15:07



АМ "Тракия", Лот 3 "Нова Загора – Ямбол"

от км 241+900 до км 277+597, дължина – 35.697 км

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	"АКТОР" АСД	133 973 906,02 лв.
Консултантски услуги	Обединение "Т7/СНИК" ДЗЗД	1 077 240,00 лв.
Авторски надзор	„Рутекс“ ООД	111 672,00 лв.

- Начало на строителните дейности: 02.08.2010 г.
- Срок за изпълнение на строителството: 25 месеца
- Край на строителните работи съгласно договора: септември 2012 г.

Финансово изпълнение:

- Извършени са всички плащания към изпълнителя: 133 973 906,02 лв.





АМ "Тракия", Лот 4 "Ямбол – Карнобат"

от км 276+200 до км 325+280, дължина – 49,08 км

Дейност	Изпълнител	С-ст на договора с ДДС
Строителство	Сдружение "Тракия IV" ДЗЗД	209 646 720,00 лв.
Консултантски услуги	"План инвест-Пловдивинвест-Лот 4" ДЗЗД	974 400,00 лв.
Авторски надзор	Обединение "Виаплан - Бурда" ООД	112 800,00 лв.

- Начало на строителните дейности: 06.10.2010 г.
- Срок за изпълнение на строителството: 28 месеца
- Край на строителните работи: юли 2013 г.



**Лот 4.1 на АМ „Тракия“,
от км 276+200 до
км 291+000
е пуснат предсрочно
за движение на МПС
на 26.08.2012 г.**





АМ "Марица", ЛОТ 1 "Оризово – Димитровград"

от км 5+000 до км 36+400, дължина – 31,40 км

Дейност	Изпълнител	Ст-ст на договора с ДДС
Строителство	КД "Кооператива Муратори & Цементисти – Чи. Ем. Чи. Ди Равенна"	159 755 613,60 лв.
Консултантски услуги	ДЗЗД "Т7/СНИК"	678 600,00 лв.
Авторски надзор за Лот 1 и Лот 2	"Пътпроект" ЕООД	112 800,00 лв.

- Срок за изпълнение: 25 месеца
- Край на строителните работи: ноември 2013 г.





АМ "Марица", ЛОТ 2 "Димитровград - Харманли"

от км 36+400 до км 70+620, дължина – 34,22 км

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	Сдружение "Марица Хайуей"	146 564 400,00 лв.
Консултантски услуги	ДЗЗД "Рутекс - ЕТЕ"	799 200,00 лв.
Авторски надзор за Лот 1 и Лот 2	"Пътпроект" ЕООД	112 800,00 лв.

- Срок за изпълнение: 25 месеца
- Край на строителните работи: август 2013 г.





АМ "Струма", Лот 1 "Долна Диканя – Дупница" от км 305+220 до км 322+000, дължина – 16,78 км

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	"Консорциум Струма -1" ДЗЗД	70 240 800 лв.
Консултантски услуги	"Инфраструктура – Магистрални пътища" ДЗЗД	323 280 лв.

- Срок за изпълнение: 23 месеца
- Край на строителните работи: септември 2013 г.





АМ "Струма", Лот 2 "Дупница - Благоевград"
от км 322+000 до км 359+483,52, дължина – 37.48 км

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	Консорциум "Струма –ЛОТ 2"	358 722 000 лв.
Консултантски услуги	Обединение „Струма – ПП“ ДЗЗД	2 949 843 лв.

- Срок за изпълнение: 22 месеца
- Край на строителните работи: март 2015 г.
- Договор: инженеринг
- Етапи на строителство - 14





АМ „Струма“ , Лот 4 “Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500, дължина – 14,70 км

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	“АКТОР” АСД	67 176 000,00 лв.
Консултантски услуги	„Пътинвест инженеринг” АД	356 419,20 лв.

- Срок за изпълнение: 23 месеца
- Край на строителните работи: март 2014 г.





Изграждане на път Е-85 (I-5) "Кърджали – Подкова"

от км 342+639 до км 367+427, дължина - 34,1 км

Дейност	Изпълнител	Ст-ст на договора с ДДС
Строителство	ДЗЗД „Кърджали-Подкова“	38 387 455,20 лв.
Консултантски услуги	ДЗЗД „Инфраструктура – Магистрални пътища“	226 800,00 лв.
Авторски надзор	„Рутекс“ ООД и „Виаплан“ ЕООД	129 600,00 лв.

- Срок за изпълнение: 25 месеца
- Край на строителните работи: септември 2013 г.






Изграждане на участък от АМ "Хемус" от СОП до пв "Яна" от км 0+000 до км 8+460, дължина – 8,46 км

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	ДЗЗД „Хемус А2“	38 340 371,34 лв.
Консултантски услуги	“Трансконсулт – БГ” ООД	181 440,00 лв.
Авторски надзор	„Пътпроект“ ЕООД	111 600,00 лв.

- Срок за изпълнение: 22 месеца
- Край на строителните работи: август 2013 г.

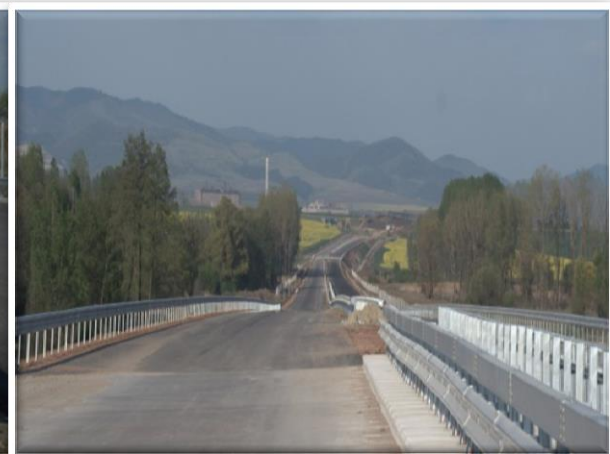




АМ "Калотина – София", Лот 1 „Западна дъга на СОП“ Участък 1

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	Обединение "Трейс СОП" ДЗЗД	47 820 000 лв.
Консултантски услуги	ДЗЗД "Сдружение Пътконсулт 2000 - Три ес"	1 171 800 лв.

- Срок за изпълнение: 22 месеца
- Край на строителните работи: юли 2014 г.

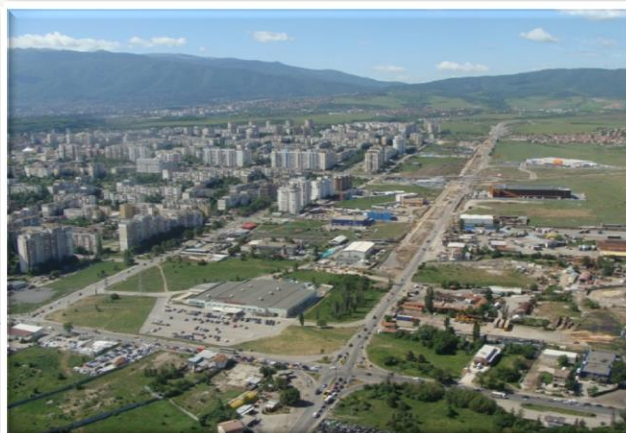



„Обход на гр. Габрово“ Участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	Консорциум “ПСВТ”	92 940 000 лв.
Консултантски услуги	„Обединени консултанти“ ДЗЗД	1 096 032 лв.

- Срок за изпълнение: 540 дни
- Етапи на строителство: 17
- Разрашение за строеж:

Издадено за Първи етап на проекта на
15.05.2013 г.






Обход на град Враца – Път I-1 (E79) от км 0+000 до км 6+816.60

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора с ДДС
Строителство	„Обход Враца“ ДЗДД	14 600 989.45 лв.
Консултантски услуги	„Трафик Холдинг“ ЕООД	1 125 600 лв.

- Начало на строителните работи:
юни 2013
- Срок за изпълнение: 360 дни
- Край на строителните работи:
юни 2014 г.

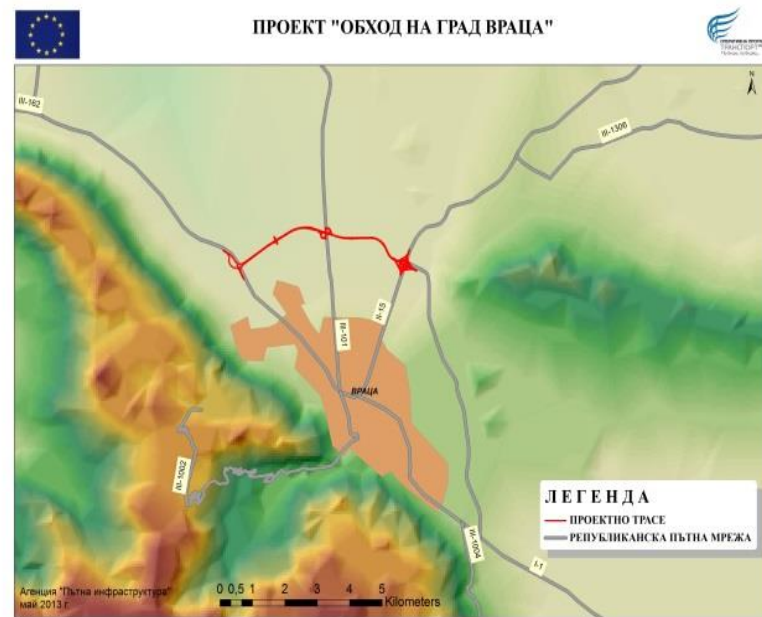



АМ „КАЛОТИНА – СОФИЯ“

ЛОТ 1 „Западна дъга на Софийски околновръстен път“

Участък 2: от р. Какач до Северна скоростна тангента

АВТОМАГИСТРАЛА "КАЛОТИНА - СОФИЯ"
ЛОТ 1 - "ЗАПАДНА ДЪГА НА СОП"



➤ Дължина: 5,50 км


➤ Тръжни процедури за избор на строител и строителен надзор са стартирали на 28.02.2013 г.

➤ Процедури по ОВОС: Решение на МОСВ от 27.09.2010 г.

ЛОТ 2 „Северна скоростна тангента“


➤ На 28.05.2013 г. Комитета за наблюдение на ОП «Регионално развитие» прие проектът да се финансира по ОПРР

➤ Дължина: 16.5 км

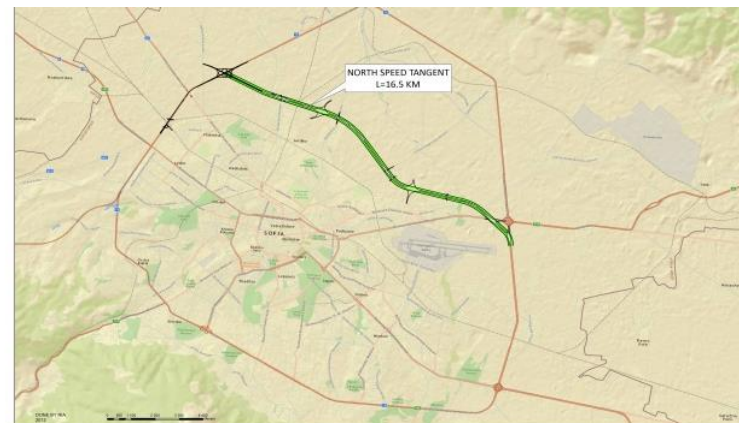



АМ „КАЛОТИНА-СОФИЯ“, ЛОТ 3 „Калотина – Софийски околостретен път“

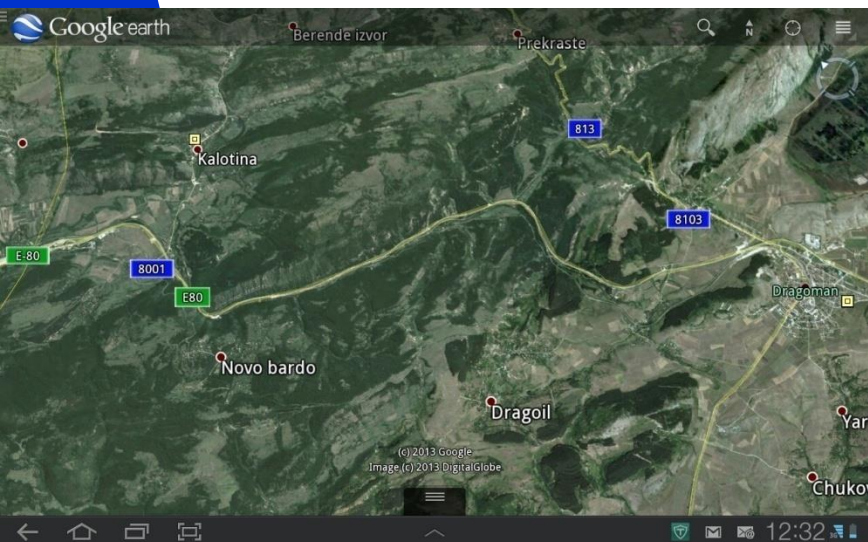

- Дължина: 47.3 км
- Индикативна стойност: 100 млн. евро
- Проектът е разделен на два участъка:
Участък 1: „ГКПП Калотина – пв Петърч“ – 31,5 км;
Участък 2: „Пв Петърч – СОП“, планиран за изпълнение през периода 2014-2020

Обходен път на гр. Монтана – Път I-1 (Е-79)

- Дължина: 12,5 км
- Формуляр за БФП: Одобен 14.11.2012 г.
- Индикативна стойност: 38,7 млн. евро






Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) Враца (Мездра) - Ботевград от км 161+367 до км 194+122



- **Дължина:** 32,755 км.
- **Индикативна стойност:** 188 млн. евро
- **Разделен на два лота:**
 - **Лот 1** - „Обход на с. Лютидол – Ботевград“ от км 174+800 до км 194+122;
 - **Лот 2** - „Мездра - обход с. Лютидол“ от км 161+367 до км 174+800.

Проектиране на „Път Е-79 „Видин - Монтана“

- **Дължина:** 126 км.
- I участък – Видин- Димово
- II участък – Димово-Бела-Ружинци
- III участък – Ружинци-Монтана
- IV участък – Монтана-Враца

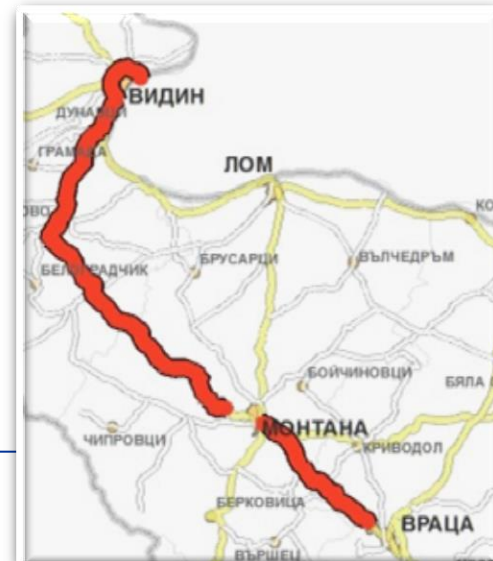

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...

**БЛАГОДАРЯ ЗА
ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!**

