



**XIV – то заседание на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.**

**Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“**

*05 – 06 Юни 2013 г.
гр. Несебър*






Напредък

- НКСИП проведе процедурите по обществени поръчки за подготовката на Лот 3 на автомагистрала Струма
- Подготвя се провеждането на обществена поръчка за *геоложки проучвания* на Лот 3
- Процедурата по обществена поръчка на *предпроектните проучвания* за автомагистрала Хемус е завършена



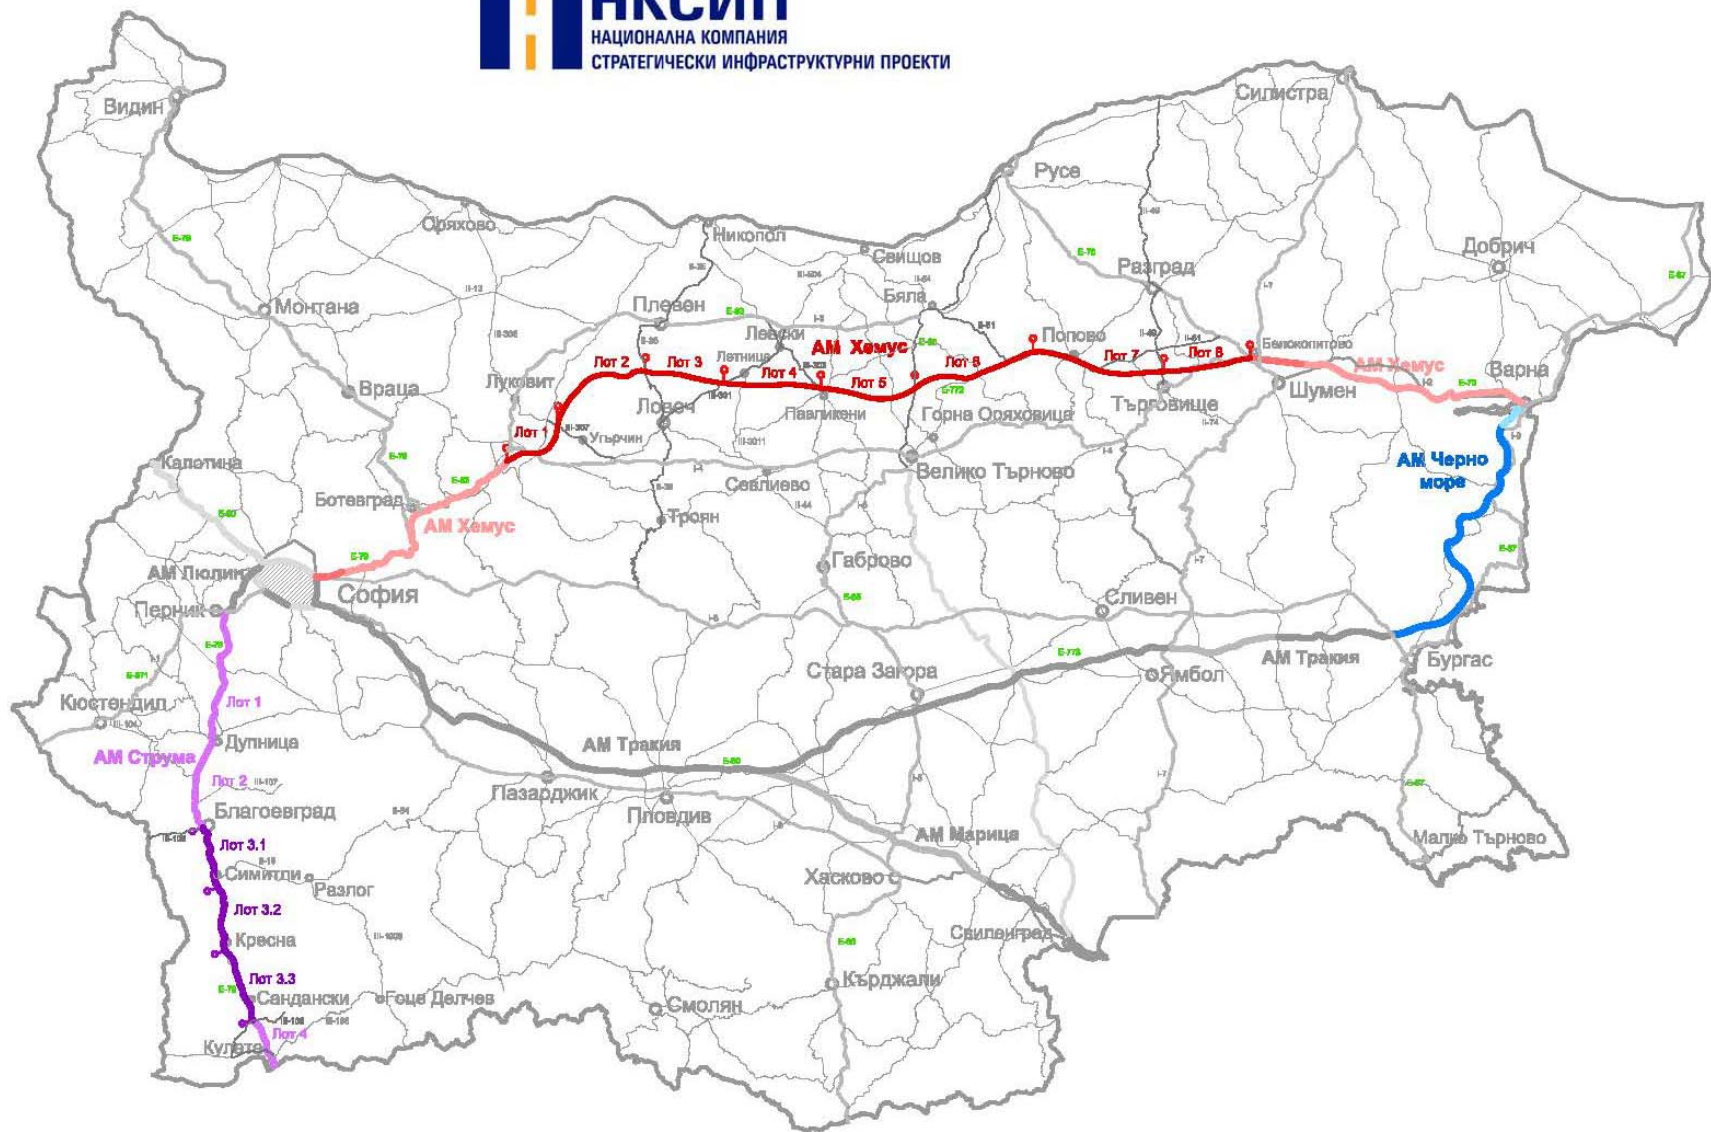



АМ Струма (1/2)

- Автомагистрала Струма е разположена в югозападната част на България и е с дължина от около 150 км
- Част от транспортен коридор IV
- Проектът е включен в Оперативна програма „Транспорт“
- Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се финансират през настоящия програмен период 2007-2013
- Изпълнението на Лот 3 е предвидено за програмен период 2014-2020 г.
- НКСИП отговаря за подготовката на Лот 3; АПИ за завършването на Лот 1, 2 и 4





АМ Струма (2/2)

- През ноември 2012 г. НКСИП стартира три тръжни процедури за избор на:
 - *Проектант на предварителния проект*, който ще подготви проектите на пътната част и тунелите
 - *Стратегически съветник* – консултант, който ще подпомага приемането на работата на проектанта и ще съдейства при подготовката на тръжните документи за строителство
 - *Екологичен консултант*, който ще работи съвместно с проектанта, за да се установят ограниченията на техническите решения от гледна точка на околната среда; обновена оценка за съвместимост





Струма Лот 3 – Идеен проект

- Процедурата по обществена поръчка приключи на 27.03.2013 г.
- Двете подадени жалби срещу решението за избор на изпълнител бяха отхвърлени
- За изпълнител на поръчката е определен участникът „Виа План - Амберг“ ДЗЗД
- Очаква се подписване на договор през юли
- Срокът за изпълнение е 18 месеца
- Провеждането на обществена поръчка за строителство може да започне през втората половина на 2014 г.





Струма Лот 3 – Стратегически съветник

- Процедурата по обществена поръчка приключи на 14.05.2013 г.
- Няма подадени жалби
- За изпълнител на поръчката е определен участникът Обединение „СВЕКО-БУРДА“
- Очаква се подписване на договор през юни





Струма Лот 3 – Екологичен консултант

- Процедурата по обществена поръчка приключи на 11.03.2013 г.
- Няма подадени жалби
- За изпълнител на поръчката е определен участникът “Данго Проект Консулт” ЕООД
- Очаква се подписване на договор през юни






Струма Лот 3 – Геоложки проучвания

- Определянето на обхвата на проучванията е част от заданието на проектанта на идеен проект (през първата фаза от работата му)
- С оглед спестяване на време и намаляване на времевите рискове, обхватът е обект на предварително разработване
- Подкрепа от JASPERS чрез изготвяне на насоки за подготовка на техническата спецификация за проучванията
- Обществената поръчка ще стартира през юли 2013



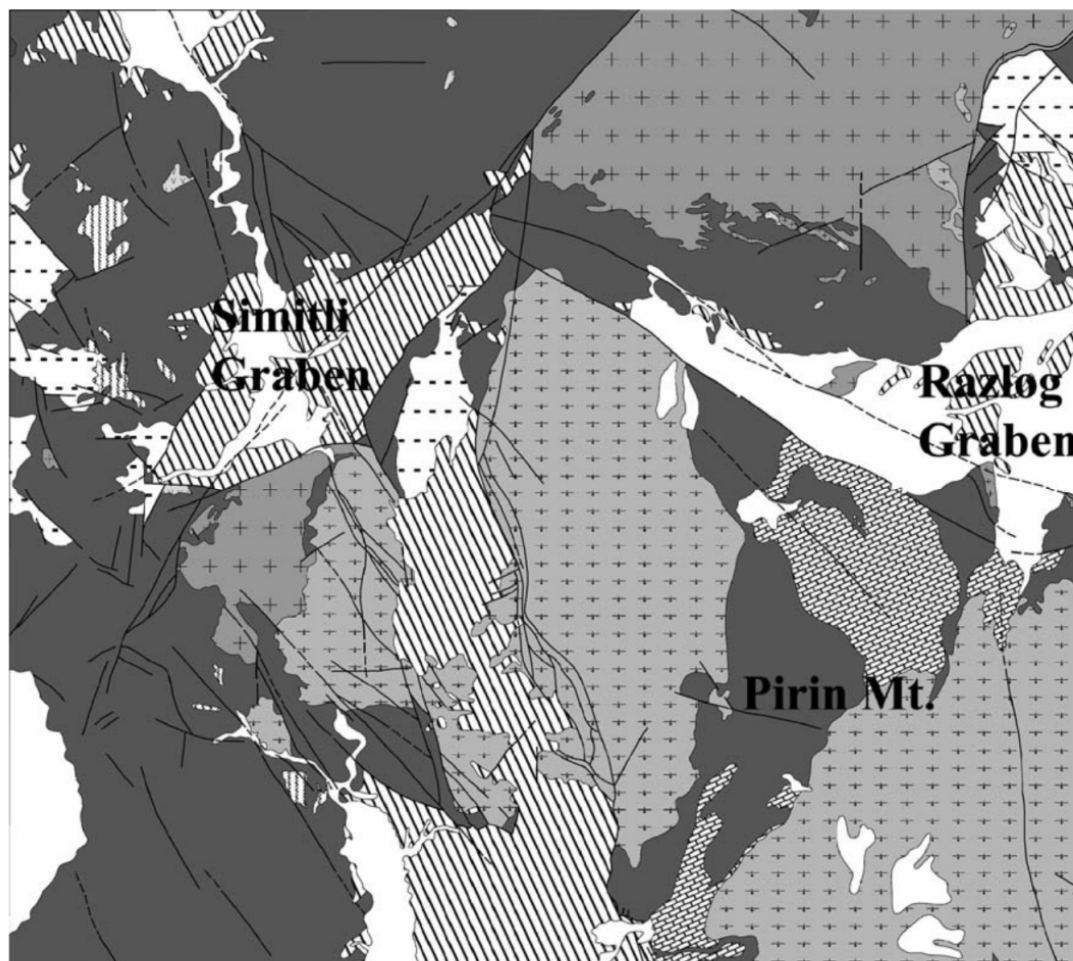

LEGEND

-  Quaternary alluvial and glacial sediments
-  Neogene undivided fluviolacustrine sediments
-  Paleogene sediments: conglomerates, sandstones, argillites, breccia and coal beds
-  Paleogene normal to sub-alkaline dacites and andesites
-  Paleogene and Upper Cretaceous granites
-  Paleozoic Rila/West Rhodopean Batholite granites
-  Precambrian - Assenovgrad Group Dobrostan Marble Formation
-  Ophiolites (metabasites, metaserpentinites)
-  Precambrian basement: gneisses, schists, marbles and amphibolites
-  Faults






Струма Лот 3 – Мониторинг на смъртността

- Целта на мониторинга е идентифицирането на смъртността на диви животински видове по съществуващия път и въздействието върху популацията им
- Продължителност – 32 седмици от март 2013 г. до януари 2014 г.



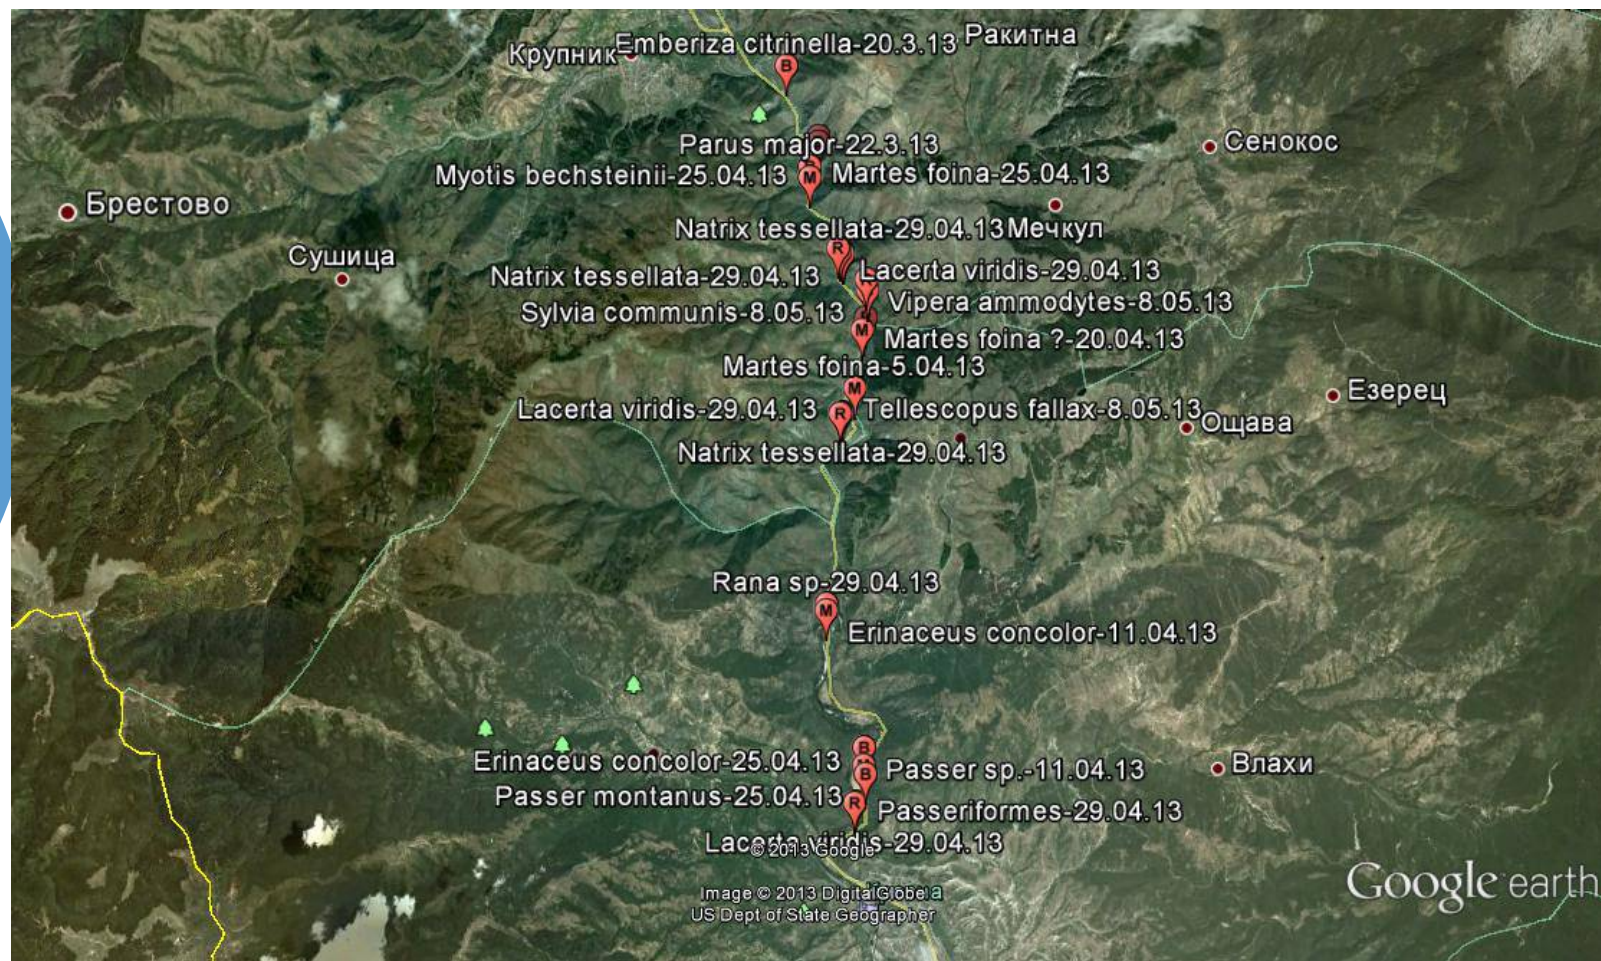



Струма Лот 3 – Мониторинг на трафика

- 24/7 класифицирано преброяване и мониторинг на скоростта в Кресненското дефиле
- Данните ще бъдат използвани при бъдещите екологични проучвания във връзка с проекта
Необходимо оборудва:
 - 2 Bluetooth сензора в двата края на дефилето (за измерване на скоростта)
 - 1 камера (за класифицирано преброяване)
- Процедурата по обществена поръчка се провежда в момента
- Системата следва да е въведена в експлоатация през юли 2013





АМ Хемус

- АМ "Хемус" е разположена в Северна България с приблизителна дължина от 420 км
- До края на 2012 г. са завършени 150 км, в строеж са още 17 км
- Оставят за доизграждане около 250 км
- Подготовката на доизграждането на АМ "Хемус" ще бъде финансирана по ОП "Транспорт".
- Приблизителната стойност на подготовителните дейности е 5,4 млн. лв. (без ДДС)





АМ Хемус

- Налични са предпроектни проучвания от 1992 и 2001 г., както и прогноза за трафика и анализ разходи-ползи от 2011 г.
- В началото на 2013 г. е обявена процедура за актуализация на предпроектните проучвания
- Подготвени са тръжни документи за изготвяне на идеен проект и доклад по ОВОС
- До края на 2013 г. ще бъдат стартирани търговете за изготвяне на идеен проект, ОВОС и предварителна археология





Предпроектни проучвания за АМ Хемус

- Процедурата по обществена поръчка приключи на 22.05.2013 г.
- Няма подадени жалби
- Очаква се подписване на договор през юни
- Срокът за изпълнение е 10 месеца
- Избор на предпочитан вариант за трасе след 4 месеца





Техническа помощ

- Консултант от JASPERS – ангажиран от края на 2012 г., като оказва съдействие при подготовката на АМ Струма – Лот 3 и АМ Хемус
- Консултант от ЕИБ – процедурата по обществена поръчка е проведена и се очаква подписване на договор до края на юни 2013





**XIV – то заседание на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.**

**Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“**

*05 – 06 Юни 2013 г.
гр. Несебър*

